



HRADUBICKÁ

LABSKÁ CYKLOSTEZKA

*Cyklostezka
Mechu a Perníku*

Aktuální informace:


- **Vysoká nad Labem - Opatovice nad Labem**

- Asfaltový povrch, šíře 3,0 metru + 2 x 0,5 zpevněné krajnice - volná šířka 4,0 metru
 - Vazba na již postavený úsek Vysoká - Hradec Králové
 - Opatovice spíše přidružené k Hradci Králové - dopravně, pracovně, logisticky
 - Celkový úsek délky 2550 metrů, investiční náklad 24. mil. Kč
 - Termín realizace 2023
 - Dokumentace pro sloučené řízení hotova
 - Chybí vyjádření policie a dopravy - blokování podmínkami policie
 - Zbylé DOSS jsou hotové
-
- Úsek je evidován v rámci podpory ITI 2021+ pro fyzickou realizaci, prošel prezentací na pracovní skupině Doprava a je průběžně aktualizován, valná hromada je o aktualizaci tohoto záměru pravidelně informována.



HRADUBICKÁ
LABSKÁ CYKLOSTEZKA



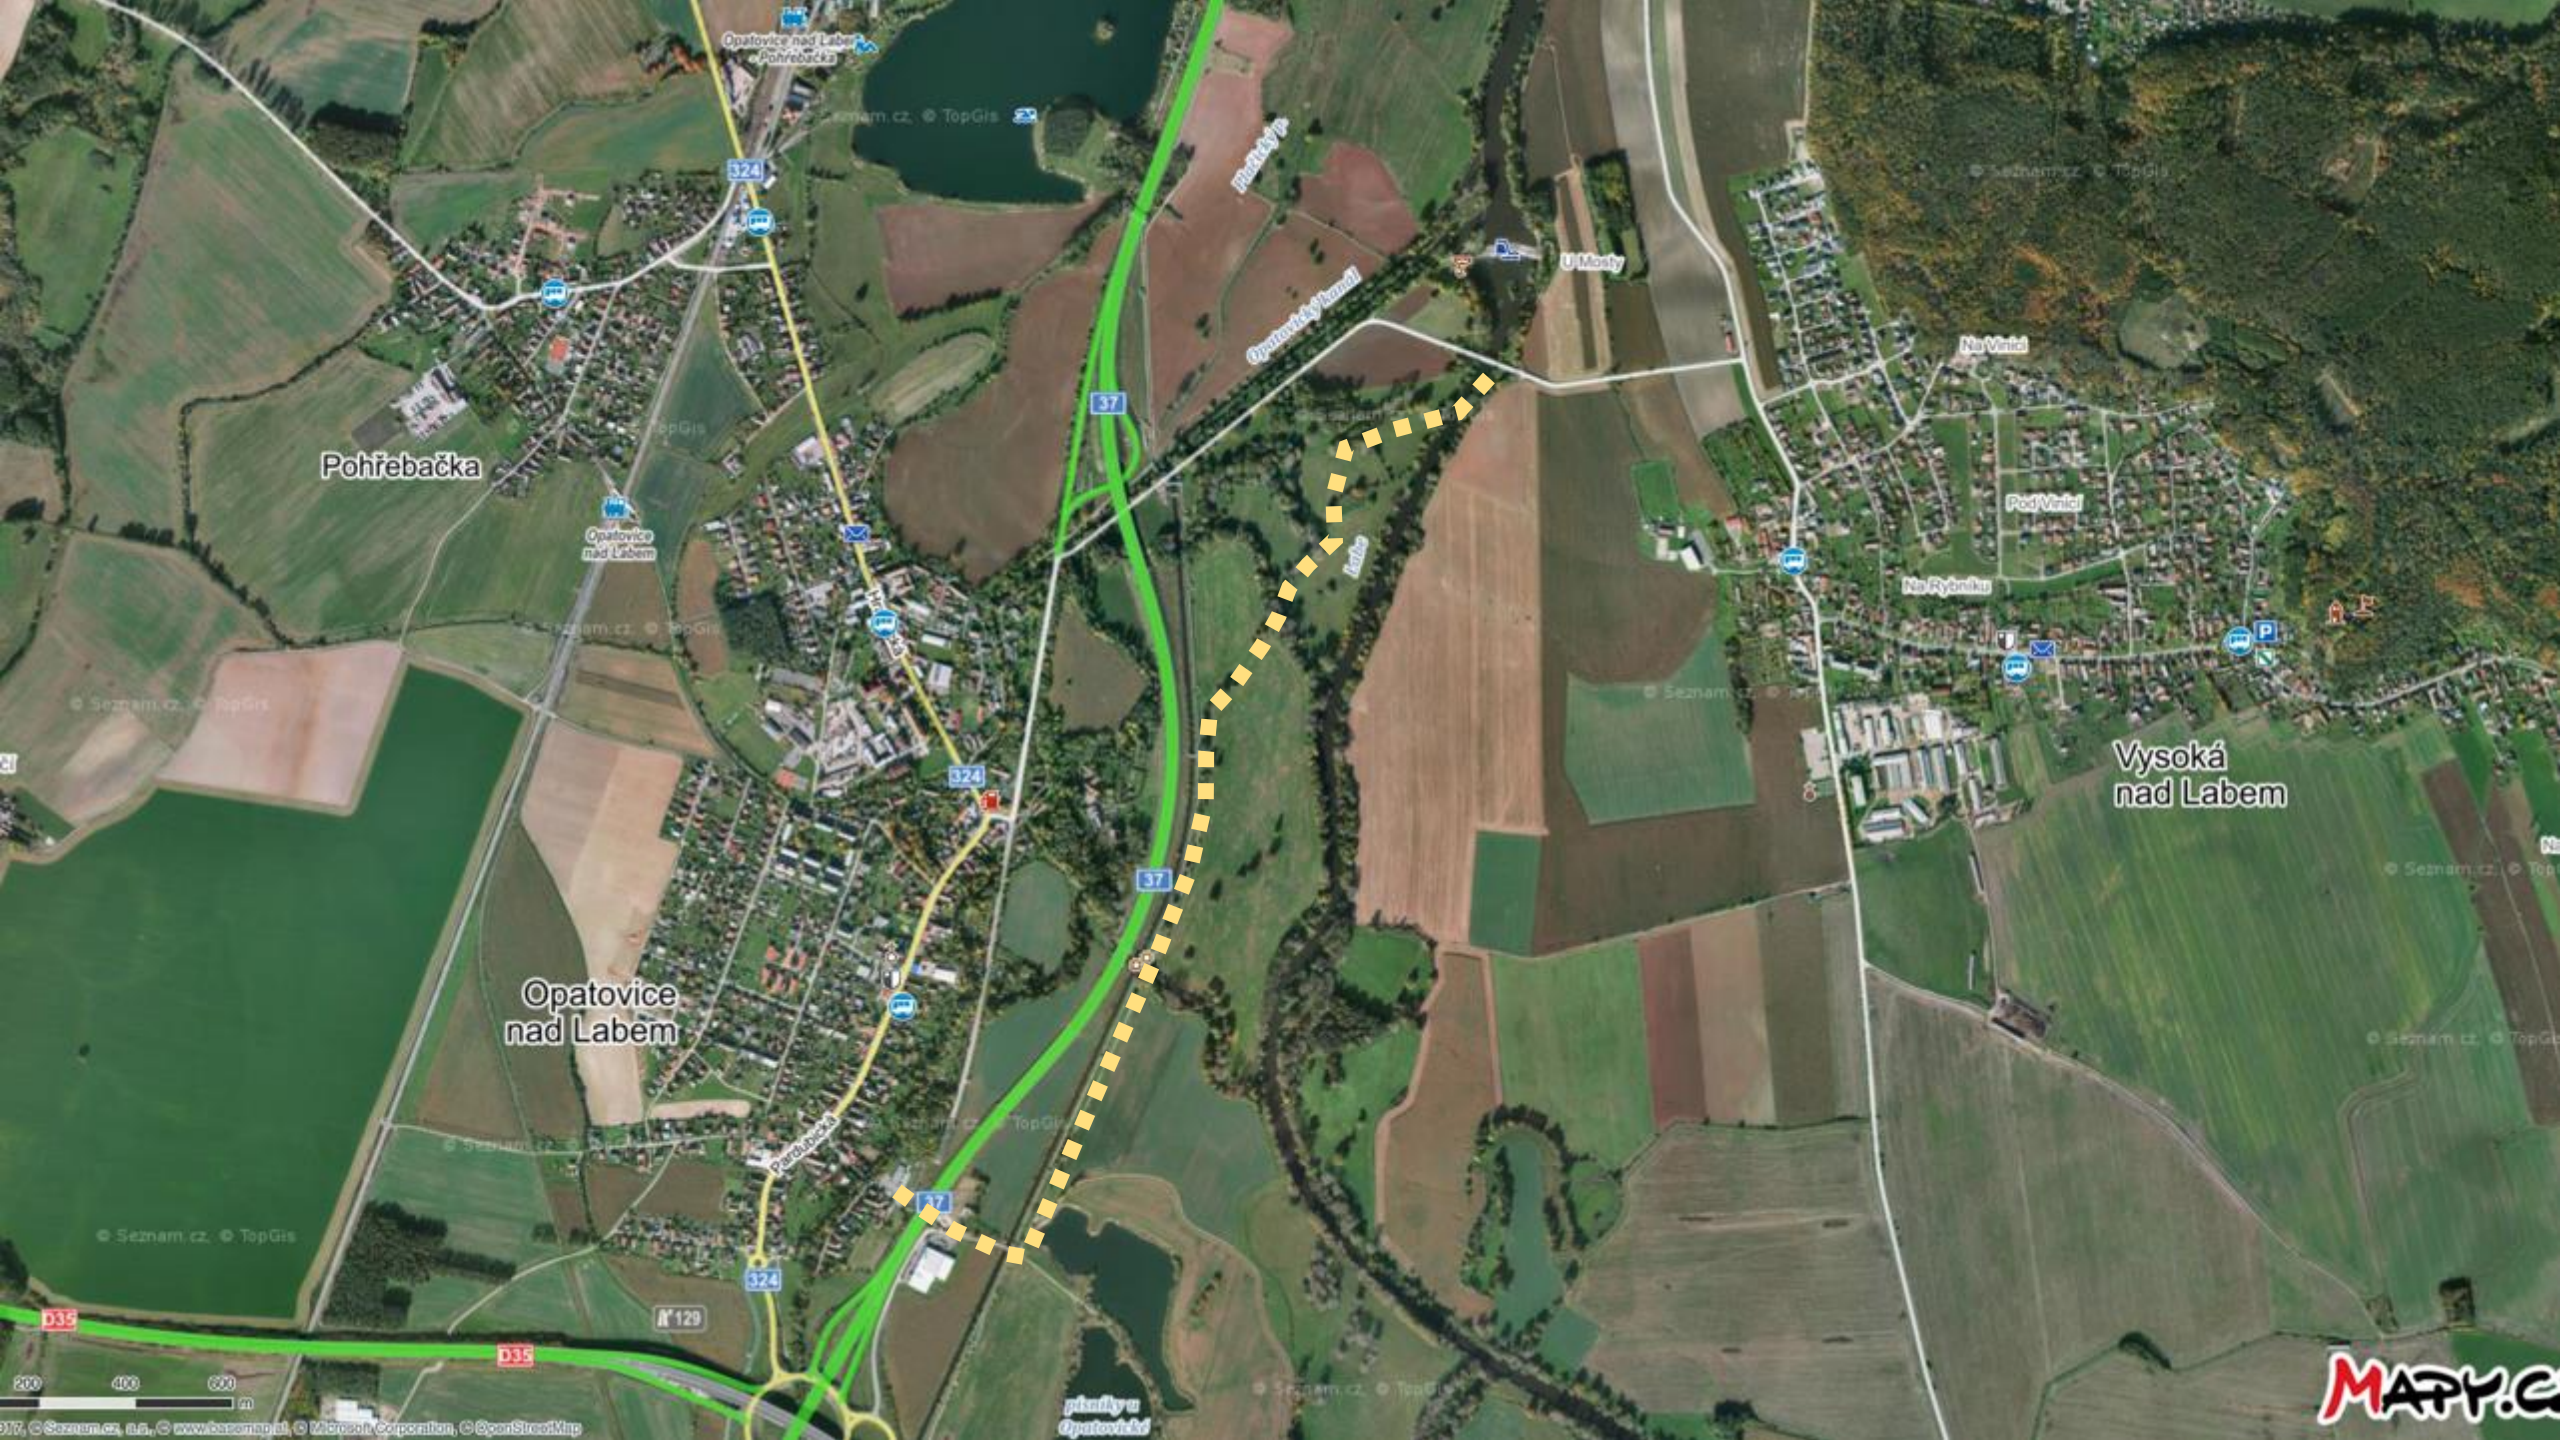

Pohřebačka

Opatovice nad Labem

Vysoká nad Labem

MAPY.CZ

Aktuální informace:


- **Opatovice nad Labem - Dříteč**

- Asfaltový povrch, šíře 3,0 metru + 2 x 0,5 zpevněné krajnice - volná šířka 4,0 metru
 - Nejdelší úsek stezky s druhým přemostěním Labe
 - Nová dopravní vazba západ východ v území
 - Stále fáze řešení pozemků vykoupěno 60% podél toku
 - Celkový úsek délky 6100 metrů
 - Termín realizace 2025
 - Chybí plán investic pro výkupy pozemků - podpora aktuálně směřována na výstavbu úseků
 - Nutné začít dělat smlouvy o smlouvách budoucích na výkupy
-
- Úsek je evidován v rámci podpory ITI 2021+ pro fyzickou realizaci, prošel prezentací na pracovní skupině Doprava a je průběžně aktualizován, valná hromada je o aktualizaci tohoto záměru pravidelně informována.



HRADUBICKÁ
LABSKÁ CYKLOSTEZKA



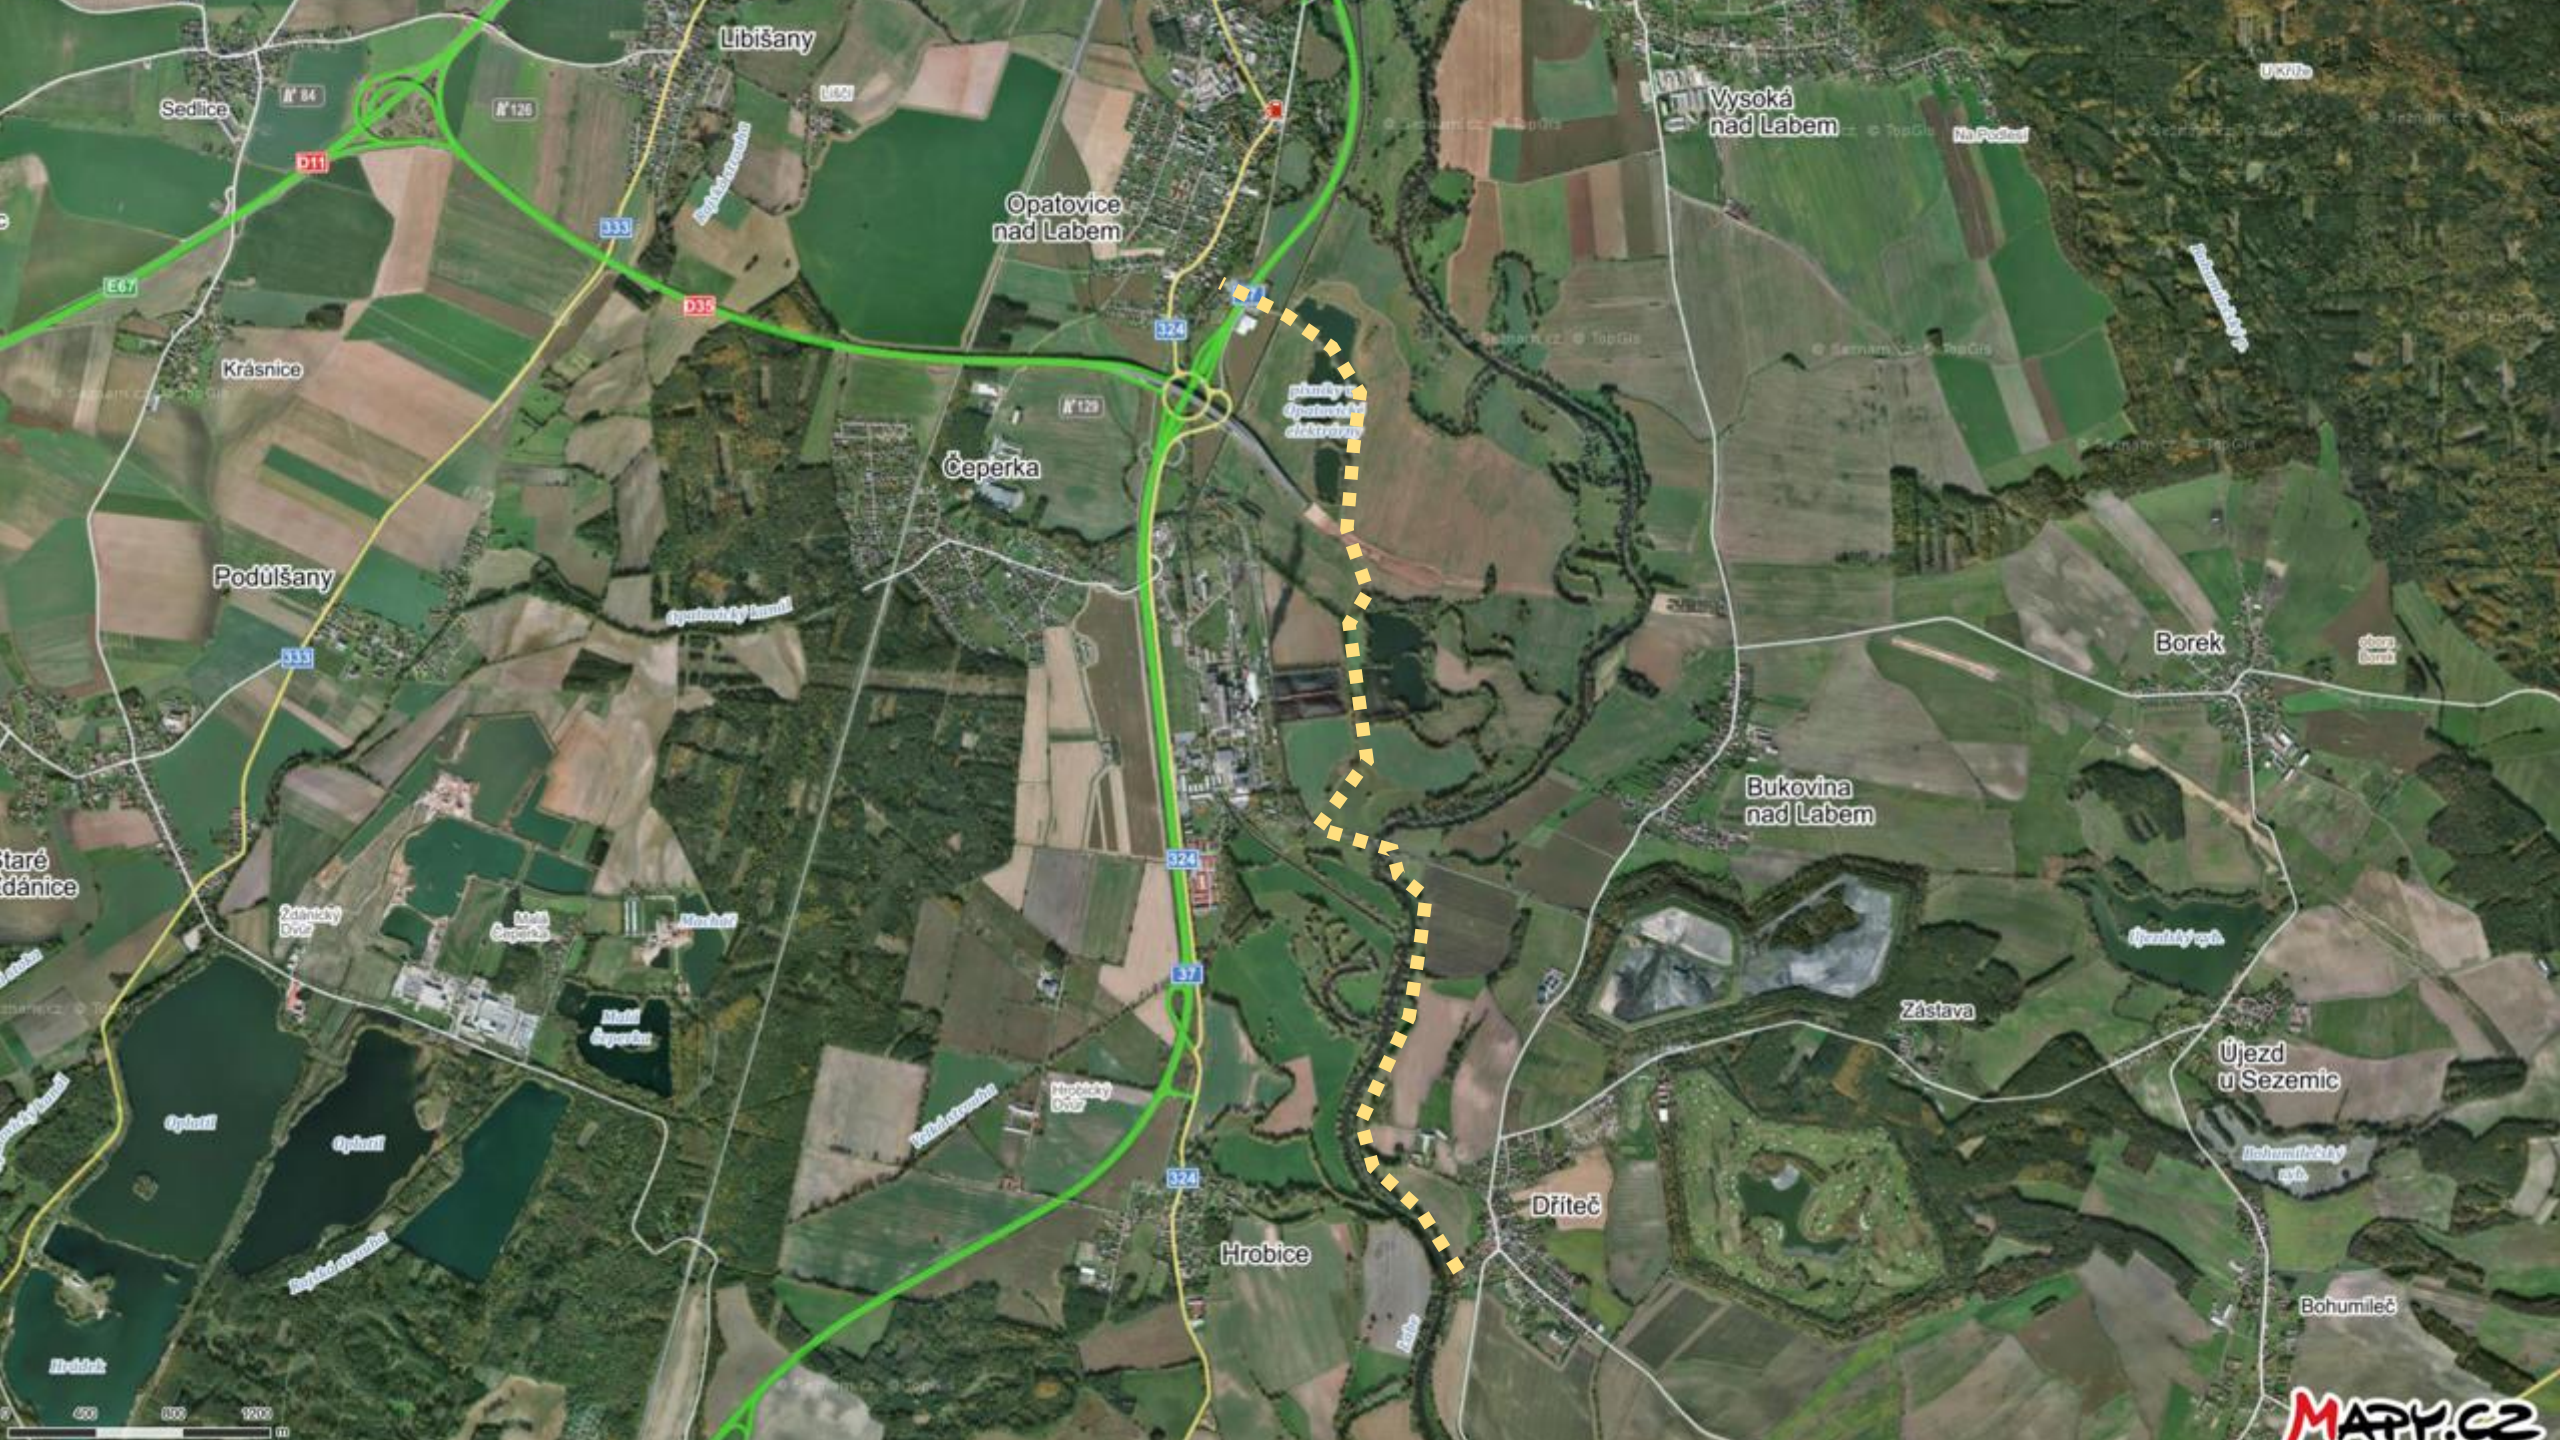

Aktuální informace:


Úsek Ráby - Kunětice:

- Aktuálně dokončena aktualizace záborů
 - Celkem 10 vlastníků, 1x problematický pozemek
 - Nutná domluva nad řešením stavby. Vynechání pozemku například.
 - Bylo provedeno hrubé zaměření území před Ráby napravo, směr Kunětice a také byl do návrhu zapracován návrh vedení stezky v rámci developerského projektu po levé straně.
 - Výkupy opět nejsou finančně kryté prozatím
 - Bude nutné taky režim budoucích kupních smluv
 - A nutné je obnovit práce na oslovení vlastníků
-
- Úsek je evidován v rámci podpory ITI 2021+ pro fyzickou realizaci, prošel prezentací na pracovní skupině Doprava a je průběžně aktualizován, valná hromada je o aktualizaci tohoto záměru pravidelně informována.



HRADUBICKÁ
LABSKÁ CYKLOSTEZKA



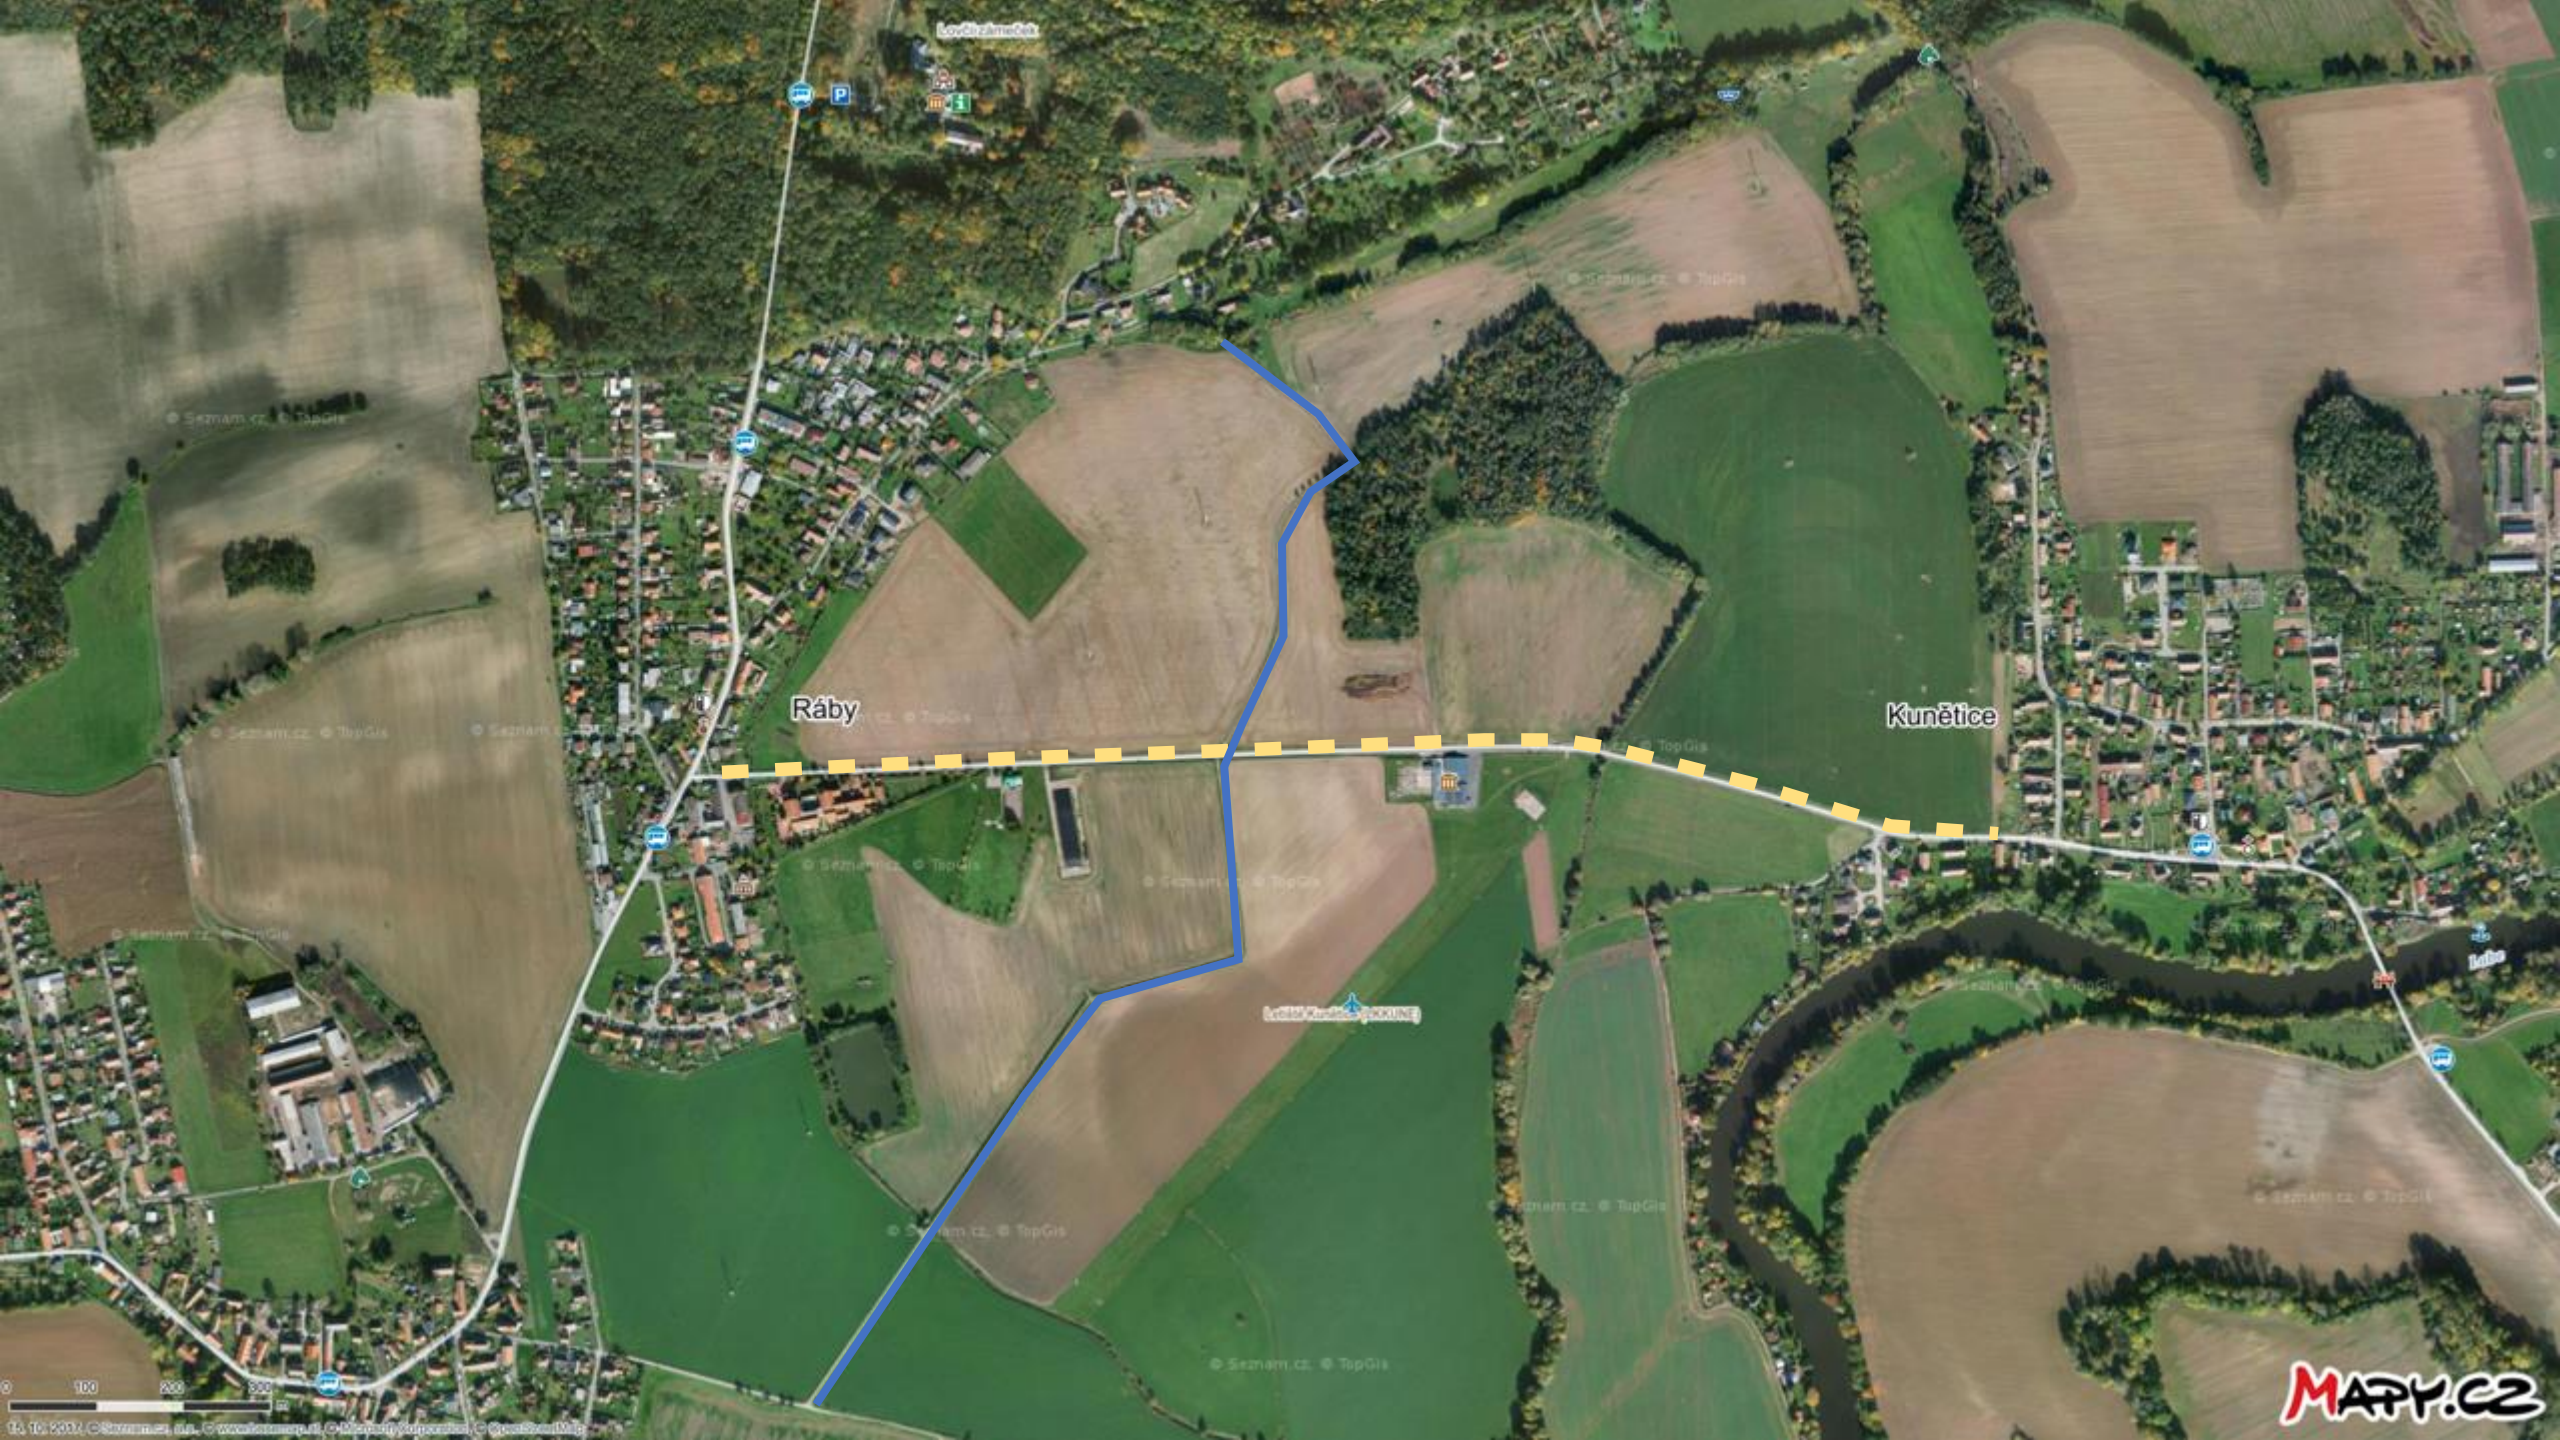

Ráby

Kunětice

ČESKÉ KURČATSKÉ POKLONKY

Aktuální informace:

Úsek Hrobice – Němčice:

- Aktuálně zpracován záborový eleborát
 - Maximálně 2x vlastník na krajích obecních pozemků
 - Více než 80 % obce Hrobice nebo Němčice
 - Náklady na výkup pozemků 150 tis. Kč
 - Délka úseku 1,4 Km
 - Vlastníci obeslání bez reakce bohužel zatím
 - Bude nutné taky režim budoucích kupních smluv
 - A nutné je obnovit práce na oslovení vlastníků
-
- Úsek je evidován v rámci podpory ITI 2021+ pro fyzickou realizaci, prošel prezentací na pracovní skupině Doprava a je průběžně aktualizován, valná hromada je o aktualizaci tohoto záměru pravidelně informována.



HRADUBICKÁ
LABSKÁ CYKLOSTEZKA





Aktuální informace:

Úsek Brozany:

- Aktuálně zpracován záborový po změně
- Prozatím bez dalšího řešení
- Úsek je evidován v rámci podpory ITI 2021+ pro fyzickou realizaci, prošel prezentací na pracovní skupině Doprava a je průběžně aktualizován, valná hromada je o aktualizaci tohoto záměru pravidelně informována.



HRADUBICKÁ
LABSKÁ CYKLOSTEZKA







HRADUBICKÁ
LABSKÁ CYKLOSTEZKA



Děkuji za pozornost
